Montageanweisung - Elementdecke

DECKENAUFLAGER	Der Auftraggeber hat ein ausreichend tragfähiges Auflager für die Decke bereitzustellen. Der Lieferumfang beinhaltet keinen Nachweis der Tragfähigkeit der Auflagerbauteile.
TRANSPORT	Fertigteile werden nach der Produktion waagrecht gelagert und transportiert (keine Zwischenlagerung). Die Montage erfolgt mittels Autokran direkt vomTransportfahrzeug.
ANHÄNGEN UND ABLADEN	Die Kranhaken des Gehänges sind in den Knotenpunkten der Gitterträger einzuhängen. Anschlagmittel vom Bauteil erst lösen, wenn dieser in der richtigen Lage und gesichert ist.
ERRICHTUNG DER UNTERSTELLUNG	lt. Angabe der max. Unterstellungsstützweite im Verlegeplan ist eine ausreichend tragsichere und standsichere Unterstellung zu errichten.
ÜBERHÖHUNG	Überhöhung der Elemente l/250 in Feldmitte bzw. lt. Angabe vom Statiker
MONTAGEREIHENFOLGE	Die Deckenelemente gemäß der Lage im Verlegeplan verlegen. Nicht verdrehen oder vertauschen! Die Positionsnummern, die Lage von Aussparungen, Zulagen etc. sind zu kontrollieren.
ENTFERNEN DER UNTERSTELLUNG	Entfernen der Unterstellung unter Einhaltung der gültigen Ausschalfristen (Ö-Norm B 4710)

MONTAGESTÜTZWEITE

keine Randunterstellung erforderlich wenn Auflager größer gleich 5cm

Randunterstellung erforderlich wenn Auflager kleiner als 5cm

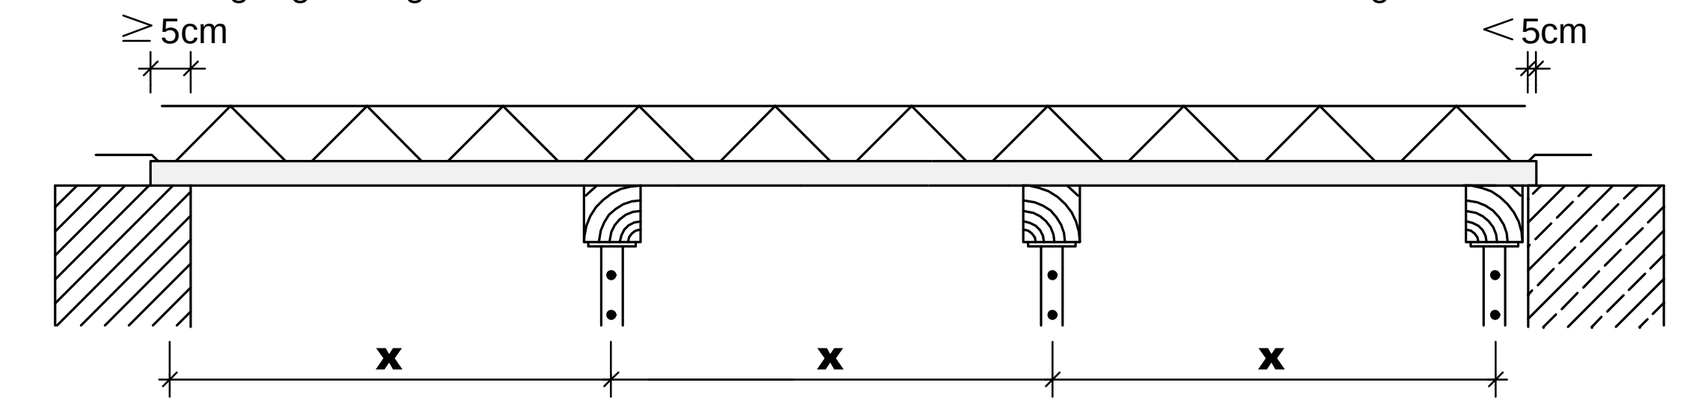

x ... max. Montagestützweite: 1,40 m

kein Maßstab

Vor dem Aufbetonieren auf die endgültige Deckendicke sind alle Aussparungen sowie alle Einbauteile auf richtige Größe und Lage verantwortlich zu prüfen! Nachträgliche Reklamationen werden nicht anerkannt!

VERLEGEPLAN DECKE

Auftraggeber: MUSTER

Bauvorhaben: MUSTER

Bauteil: MUSTER

Decke (1): d = 20 cm	Auflast: 6,20 kN/m²	Decke (2): d = 25 cm	Auflast: 7,00 kN/m²
15 cm Aufbeton ...	Betongüte: C 25/30	20 cm Aufbeton ...	Betongüte: C 25/30
5 cm Elementplatte ...	C 25/30 XC2	5 cm Elementplatte ...	C 25/30 XC2
2,0 cm Betondeckung	Stahlgüte:	2,5 cm Betondeckung	Stahlgüte:
Gitterträger 130mm	BST 550	Gitterträger 170mm	BST 550

Auftrags-Nr.: 5

Bearbeiter: X

Telefon-Nr.: 0

Plan ist vom Auftraggeber auf eigene Verantwortung zu prüfen!

KAMMEL
FERTIGKELLER - FERTIGBETON - BAUSTOFFE
KAMMEL Ges.m.b.H., A-8232 Grafendorf, Gewerbestraße 162
Tel.: 03338-2396-0, Fax: -39, www.kammel.eu, office@kammel.eu

INDEX	Änderung	Datum	Gez.
B			
A			
	Erstausdruck	3	

Maßstab: M 1:50

Plan-Nr.: D01

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

Allplan 2012
